

18.8.2025

Styrelsen

Sammanträdestid: 18.8.2025 kl. 10:30 - 10.50

Sammanträdesplats: via Teams

Medlemmar Sara Kemetter, ordförande
Robert Mansén, vice ordförande
Sandra Listherby, ledamot
Birger Forsberg, ledamot
Edvard Johansson, ledamot
Erika Boman, ledamot

Övriga deltagare

Ulrika Österlund, ekonomichef
Otto Ilmonen, avdelningschef
Timo Pajunen, projektledare
Maria Pettersson, Cambio
Johan Thorwid, Cambio

Föredragande

Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ärenden som behandlats

§ 59-60

Undertecknande av protokollet

Sara Kemetter
Ordförande

Solveig Gestberg
Protokollförare

18.8.2025

Styrelsen

Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör
Föredragande

Protokolljustering

Mariehamn den 18.8.2025

Robert Mansén

Protokollet finns till påseende

Protokollet finns till påseende på www.ahs.ax från den 19.8.2025

Styrelsen

Sammanträdestid 18.8.2025 kl. 10:30

Sammanträdesplats via Teams

§ 59 Sammanträdet konstituerande	1
§ 60 VIS. Effektiv leveransdag, milstolpe 3	2

18.8.2025

Styrelsen

§ 59

Sammanträdets konstituerande

Offentligt

Konstaterades att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljustering

Till protokolljusterare utsågs Robert Mansén.

Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

18.8.2025

Styrelsen

AHS/156/2024

§ 60 VIS. Effektiv leveransdag, milstolpe 3

Offentligt

Beredare Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunens förslag

ÅHS styrelse konstaterar förseningen och dess avtalsmässiga följder.

ÅHS styrelse godkänner den nya framtagna tidplanen med motiveringen att den inte riskerar projektets slutmål och milstolpe 4.

Styrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att hantera de avtalsmässiga följderna av förseningen.

Beslut ÅHS styrelse beslöt enligt förslag.

Beslutshistorik

Ledningsgruppen 14.8.2025 § 101

Beredare Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Effektiv leveransdag, ELD, regleras i Införandeavtalets punkt 9.4.

ELD ska enligt avtalet ske senast 13 månader efter avtalstecknande vilket innebär den 15.8.2025.

För att uppnå avtalets krav gällande effektiv leveransdag ska samtliga krav vara godkända av ÅHS, samtliga avtalade miljöer ska vara levererade (driftsatta), systemet A3-certifierat enligt Finska lagkrav, konfigurationen av leveransen ska vara färdig och samtliga projektaktiviteter som krävs för att ÅHS ska kunna starta pre-golive aktiviteter, primärt migrering av information från legacysystem ska vara färdigställda.

Etablering av nytt datacenter hos Advania har dragit ut på tiden vilket gör att Cambio inte längre kan möta Projektets avtalade tidplan för ELD. Avtalsmässigt innebär detta att vi har en försening.

Cambio meddelade avtalsenligt att en risk för försening föreligger måndag den 5.8.2025. Enligt avtalet skall leverantören presentera en ny tidplan inom fem arbetsdagar. Efter detta skall projektets styrning bedöma tidplanen och antingen acceptera den eller förkasta den inom fem arbetsdagar. Projektet har avtalsenligt organiserat sig genom den

18.8.2025


Styrelsen

AHS/156/2024

gemensamma beställarorganisationen (strategisk nivå) för att hantera denna typ av ärenden. ÅHS styrelse hanterar även dessa ärenden med focus på avtalsmässiga konsekvenser.

Förslag till ny tidsplan:

Fokus för den nya tidplanen ligger på att säkertställa driftstarten som är planerad till den 27.9.2025.

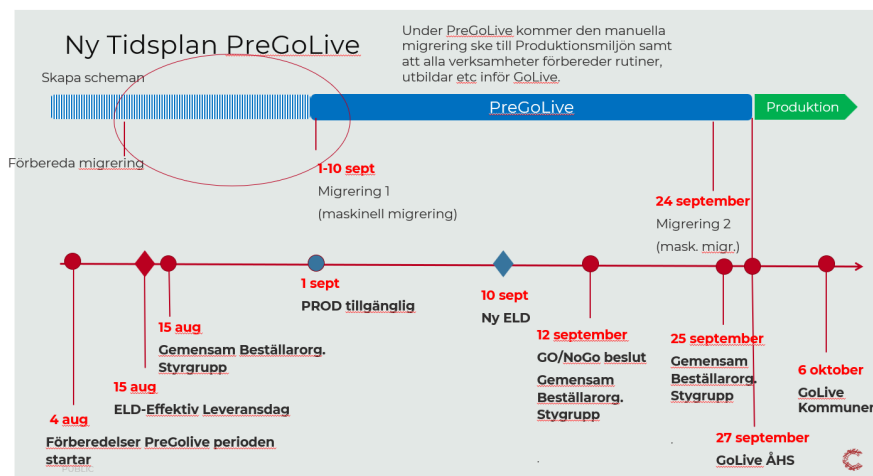

Konsekvenser av den nya tidplanen

Effektiv leveransdag försenas med drygt 3 veckor och sker istället senast den 10.9.2025, straxt innan Go/NoGo beslutet fattas. Denna försening bedöms inte riskera projektet framfart och inte heller riskera milstolpe 4. Förberedande planering, aktiviteter, framtagning av mallar mm. kan fortgå enligt plan även under det nya framtagna tidplansförslaget. PreGo live aktiviteterna bedöms vara säkrade. Eventuellt sker en framskjutning av sådana aktiviteter som involverar patientdata. Före den typen av aktiviteter kan startas behöver certifieringen vara gjord, produktionsmiljön skall vara på plats hos Advania och den slutliga konsekvensbedömningen skall vara klar.

Enligt avtalet skall ÅHS vid Effektiv leveransdag betala 20% av ersättningen för införandeprojektet samt betala för Drift samt Support&Underhåll. Vid leveransförsening har ÅHS rätt att kräva vite om 1% av ersättningen för Införandeprojektet per avslutad förseningsvecka i max 12 veckor.

Den gemensamma beställarorganisationen håller sitt sammanträde den 15.8.2025. Deras

18.8.2025

Styrelsen

AHS/156/2024

ställningstagande i ärendet presenteras vid sammanträdet den 18.8.2025.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunens förslag

ÅHS styrelse konstaterar förseningen och dess avtalsmässiga följder.

ÅHS styrelse godkänner den nya framtagna tidplanen med motiveringen att den inte riskerar projektets slutmål och milstolpe 4.

Styrelsen ger hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att hantera de avtalsmässiga följderna av förseningen.

Beslut Enligt förslag.
